




Variante di Layout Fase A

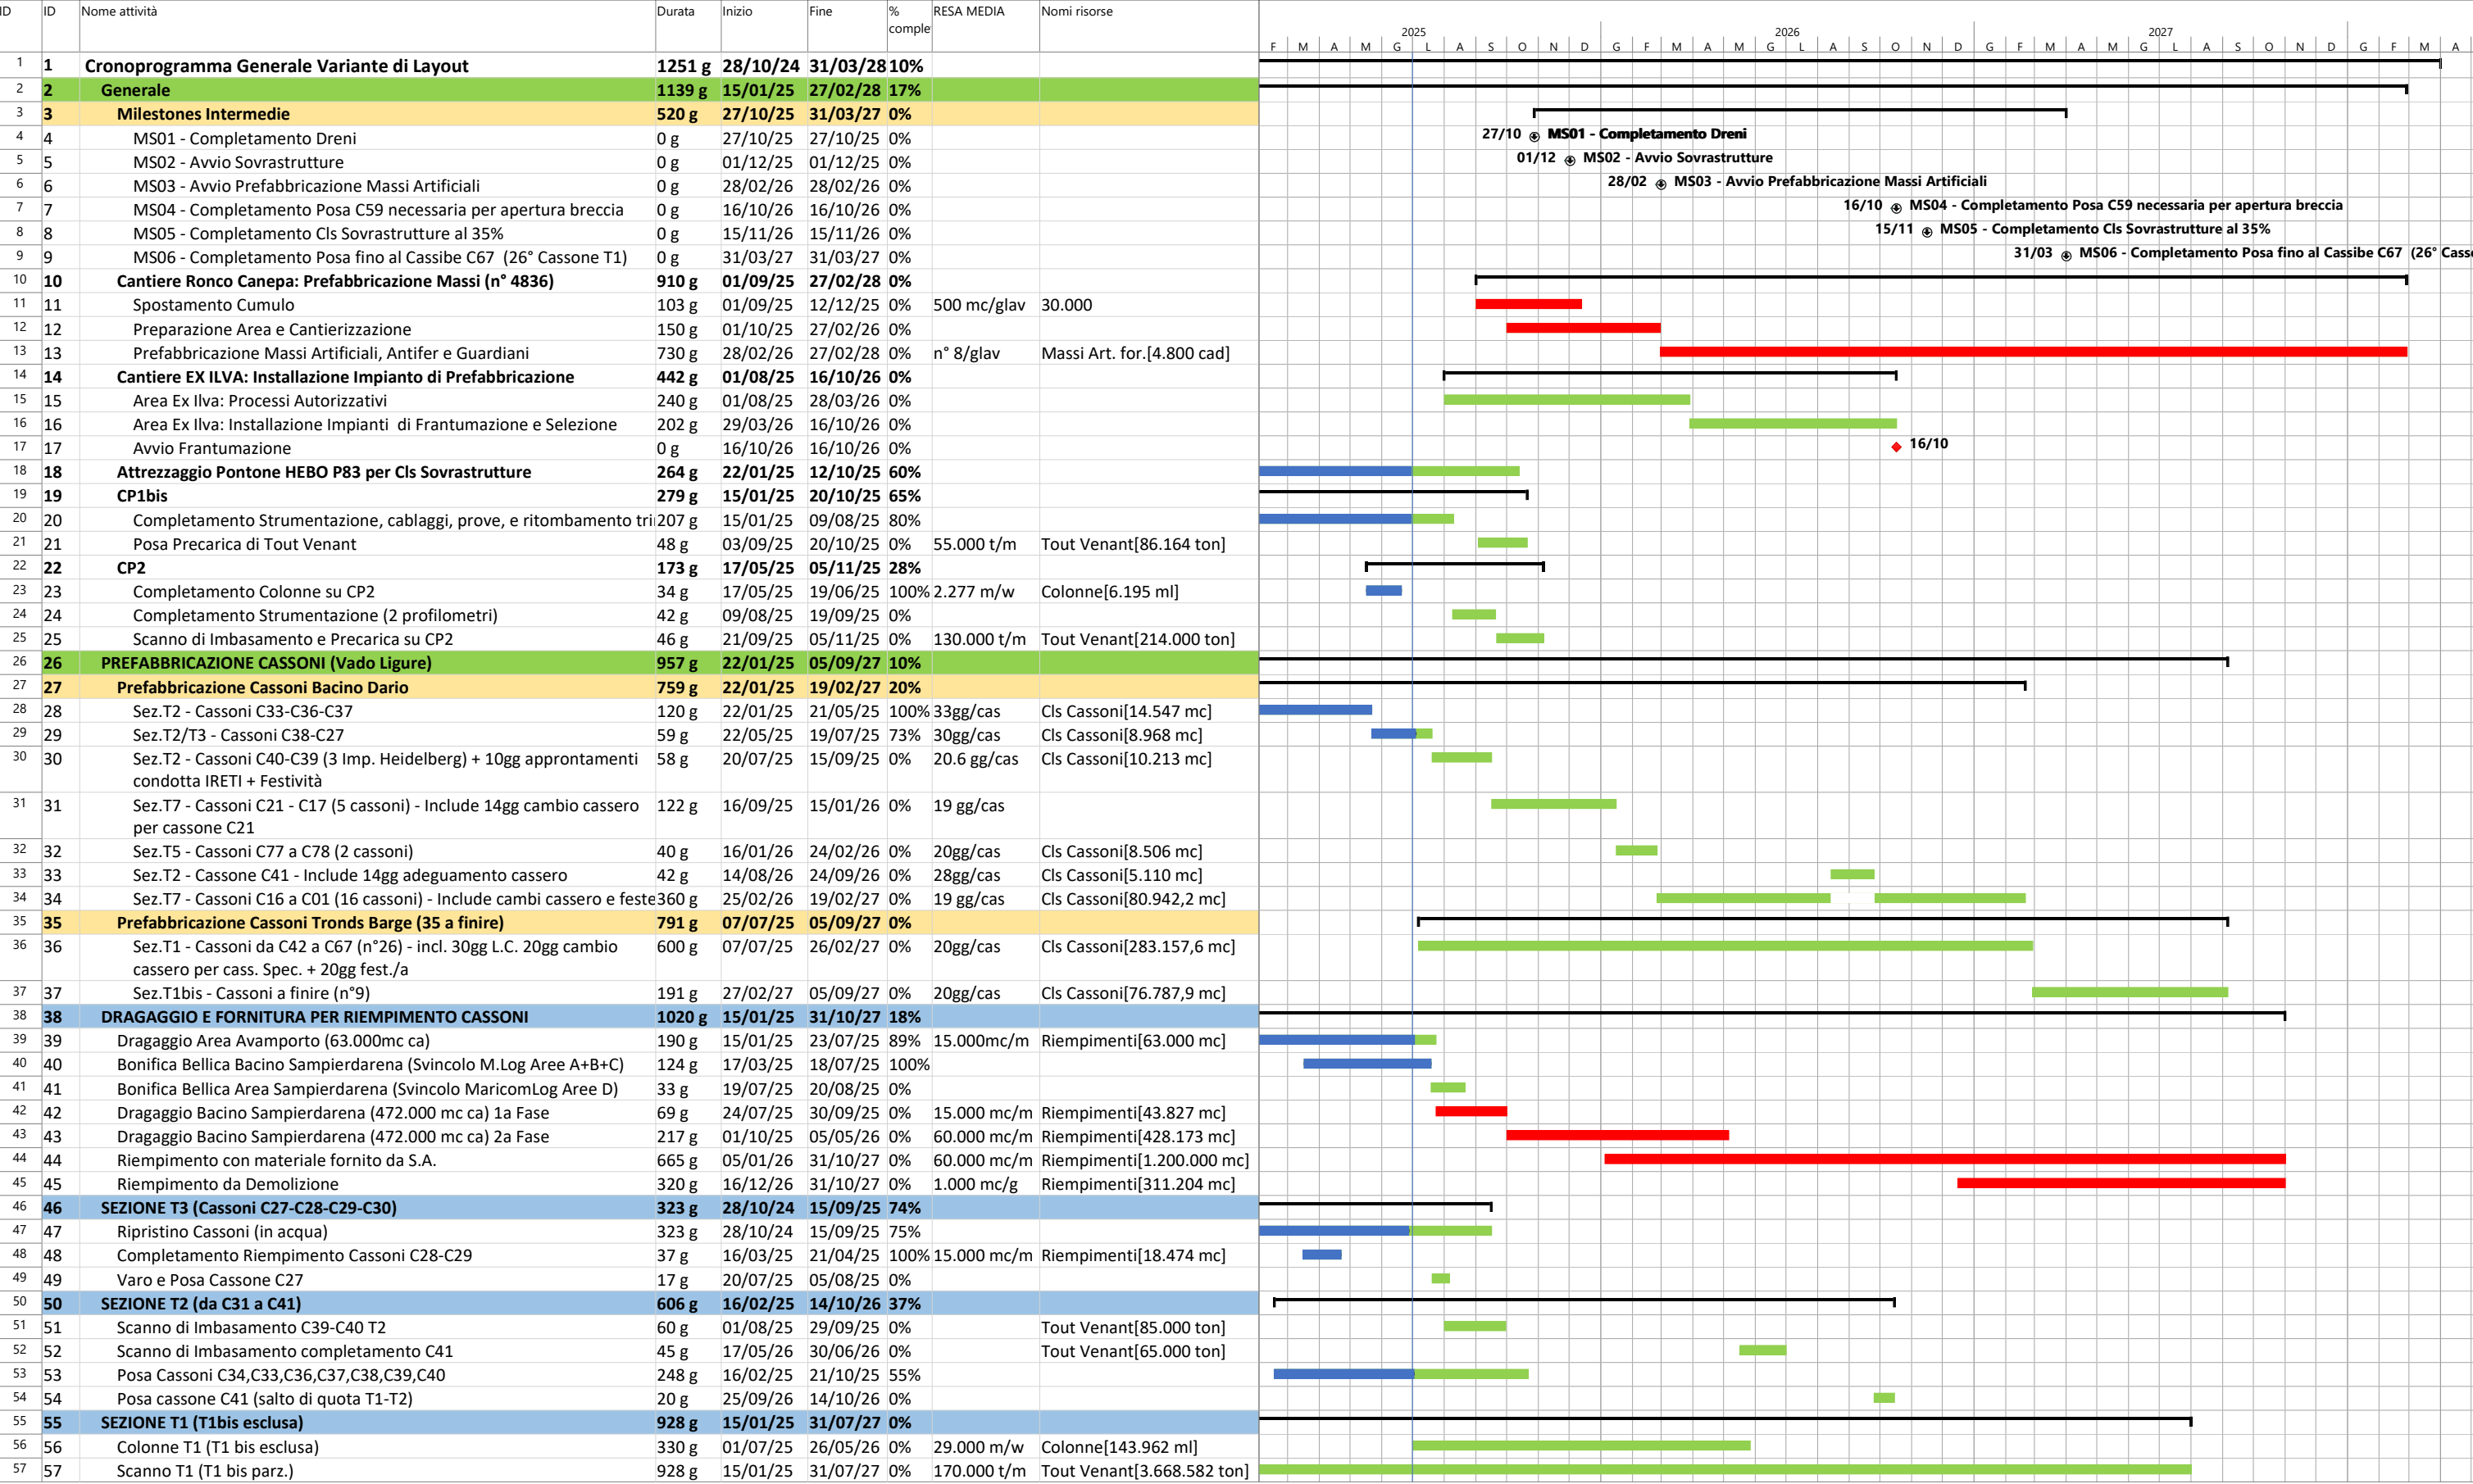

PERGENOVA BREAKWATER

ID	ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	% comple	RESA MEDIA	Nomi risorse		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A
58	58	Posa Cassoni 26 cassoni T1 (T1 bis esclusa)	565 g	28/08/25	15/03/27	0%																														
59	59	SEZIONE T6 (Massicciata)	1224 g	24/11/24	31/03/28	9%																														
60	60	Ricollocamento massi naturali e pietrame recuperati da esistente	1060 g	24/11/24	19/10/27	21%	12.927 mc/m	Massi Nat. rec.[450.752 mc]																												
61	61	Posa massi artificiali recuperati da esistente 37t e 55t	669 g	02/06/26	31/03/28	0%	500 mc/g	Massi Art. rec.[129.545 mc]																												
62	62	Posa massi artificiali di nuova fornitura antifer da 55t e 72t	749 g	14/03/26	31/03/28	0%	8 cad/g	Massi Art. for.[84.360 cad]																												
63	63	SEZIONE T5 (C77-C78)	818 g	26/11/24	21/02/27	28%																														
64	64	Salpamento Massi 6-8t in area Innesto (incl. Area dreni)	230 g	26/11/24	13/07/25	94%	202mc/g	Salp. Massi 6-8t[39.000 mc]																												
65	65	Bonifica Bellica (30gg) e Svincolo Maricom Log (15gg)	102 g	17/02/25	29/05/25	100%																														
66	66	Tappetino di fondo e Dreni (20gg per tappetino di fondo)	86 g	31/07/25	24/10/25	0%	10.640 m/w	Dreni[85.140 ml]																												
67	67	Scavo trincee e Installaz. 7 Piezometri + 1 Profilometro (Stazioni M9-M9	25 g	25/10/25	18/11/25	0%	1 cad/glav																													
68	68	Cablaggi e Prove - Ritombamento Trincee	6 g	16/11/25	21/11/25	0%		Ghiaia[6.844 ton]																												
69	69	Scanno di Imbasamento 1a Fase	127 g	22/11/25	28/03/26	0%	71.000 t/m	Tout Venant[292.500 ton]																												
70	70	Cedimento/Rimozione Precarica e Posa Cassoni	40 g	29/03/26	07/05/26	0%		Tout Venant[40.950 ton]																												
71	71	Riemp. C77 e C78	33 g	08/05/26	09/06/26	0%	1.000 mc/g	Riempimenti[32.855 mc]																												
72	72	Scanno di Imbasamento 2a Fase	160 g	08/05/26	14/10/26	0%	70.000 t/m	Tout Venant[375.267 ton]																												
73	73	Salpamento e Ricollocamenti massi di Protezione di Nuova Fornitura	330 g	29/03/26	21/02/27	0%	250mc/g	Massi Nat. rec.[159.210 mc]																												
74	74	SEZIONE T1bis	840 g	14/07/25	31/10/27	0%																														
75	75	Stesa Ghiaia T1 (esclusa area Condotta Acquario)	180 g	14/07/25	09/01/26	0%	214.200 t	90.000 t/m																												
76	76	Stesa Ghiaia T1 (Area Condotta Acquario)	55 g	03/03/26	26/04/26	0%	163.810 t	90.000 t/m																												
77	77	Colonne T1bis (HEBO73 35% - VENEZIA 65%) -	335 g	28/09/25	28/08/26	0%	11.000m/m	Colonne[119.589 ml]																												
78	78	Scanno di Imbasamento T1bis (T1 parz.) con materiale da recupero	231 g	07/01/27	25/08/27	0%	97.280 mc/m	Tout Venant[1.339.468 ton]																												
79	79	Posa Cassoni T1bis (9)	184 g	16/03/27	15/09/27	0%																														
80	80	Riempimento cassoni T1-T1bis con materiale da demolizione e da Fornit	320 g	16/12/26	31/10/27	0%	3.000 mc/g	Riempimenti[311.204 mc]																												
81	81	SEZIONE T7 (C21-C1)	649 g	14/07/25	23/04/27	0%																														
82	82	Bonifica Bellica e Svincolo Maricom Log	45 g	14/07/25	27/08/25	1%																														
83	83	Ghiaia T7	235 g	25/08/25	16/04/26	0%	35.000 t/m	Ghiaia[271.917 ton]																												
84	84	Colonne T7	230 g	24/10/25	10/06/26	0%	8.069 m/m	Colonne[40.800 ml]																												
85	85	Scanno di Imbasamento T7	234 g	30/12/25	20/08/26	0%	45.000 t/m	Tout Venant[356.240 ton]																												
86	86	Tempo di Galleggiamento Cassoni T7/T5 (max 4)	288 g	16/09/25	30/06/26	0%																														
87	87	Posa n° 5 Cassoni T7 (C21-20-19-18-17)	60 g	28/02/26	28/04/26	0%																														
88	88	Posa n° 16 Cassoni T7 (C16 -> C01)	360 g	29/04/26	23/04/27	0%																														
89	89	INTERFERENZE: CONDOTTE ACQUARIO	223 g	23/07/25	02/03/26	0%																														
90	90	Fornitura e Realizzazione Condotta Acquario	223 g	23/07/25	02/03/26	0%																														
91	91	SOVRASTRUTTURE	791 g	01/11/25	31/12/27	0%																														
92	92	Attività Propedeutiche all'avvio della Sovrastruttura in ciclo	30 g	01/11/25	30/11/25	0%																														
93	93	Inizio Sovrastruttura in cls - Solette e Muro Paraonde	761 g	01/12/25	31/12/27	0%	280 mc/g.cal	Cls Sovrastr.[213.486 mc]																												
94	94	DEMOLIZIONI, SALPAMENTI E RICOLLOCAMENTI	1133 g	24/11/24	31/12/27	6%																														
95	95	Salpamento e Ricollocamento Massi Naturali Sezioni (SA35-32-29-26-23	1123 g	24/11/24	21/12/27	10%	1.370 mc/g.ca	Massi Naturali[237.905,4 mc]																												
96	96	Salpamento e Ricollocamento Massi Artificiali	576 g	04/06/26	31/12/27	0%	390 mc/gcal	Massi Art. rec.[225.560 mc]																												
97	97	Demolizioni Sovrastruttura e Infrastruttura Sezz. E-E' e D-E - Fase A	330 g	17/10/26	11/09/27	0%																														
98	98	Ultimazione Posa Cassoni e Sovrastruttura	1 g	31/12/27	31/12/27	0%																														
99	99	COMPLETAMENTI	763 g	28/02/26	31/03/28	0%																														
100	100	Realizzazione Condotta Ireti (opere in mare)	548 g	01/10/26	31/03/28	0%																														
101	101	Salpamento e Ricollocamento Massi Naturali Sezioni (SA23.1-SA20)	205 g	09/09/27	31/03/28	0%	1.833 mc/g	Massi Naturali[217.989 mc]																												
102	102	Salpamento e Ricollocamento Mantellata Interna tutte le Sezioni	205 g	09/09/27	31/03/28	0%	1.833 mc/g	Massi Naturali[125.153 mc]																												
103	103	Fornitura e Posa Massi Artificiali	763 g	28/02/26	31/03/28	0%	8 cad/g	Massi Art. for.[4.800 cad]																												
104	104	Ultimazione Salpamento e Posa Massi e Condotta Ireti	0 g	31/03/28	31/03/28	0%																														
